

Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

Date: du 20 septembre au 26 septembre 2026

Travaux en semaine :

- Terrassement : Route P2 P3 P4 P5 Branche C, D et E, Pad : T25, T17, T18, T15
- Fondation : T13 T1 T7 T9 T6 T3 T12 T11
- Montage : T30 T29 T28 T27 T26
- Réseau collecteur : Excavations de tranchées de câbles Anode CPKC 12 Poste @ FOR1 (Tranchée 2), Anode CPKC 12, BJ127 @ FOR 11 et SC 17. Installation de câbles Poste @ FOR 1, FOR2 @ FOR12 (Tranchée 1), BJ1411 @ BJ1410 / BJ1311 @ BJ1410, FOR11 @ BJ126, FOR11 @ BJ126, BJ126 @ BJ127, BJ126 @ BJ127
- Autre : Sous-Station et O&M

Règles de sécurité :


- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boute-feu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

Contact :

- CA-quebeceolien@edf-re.com

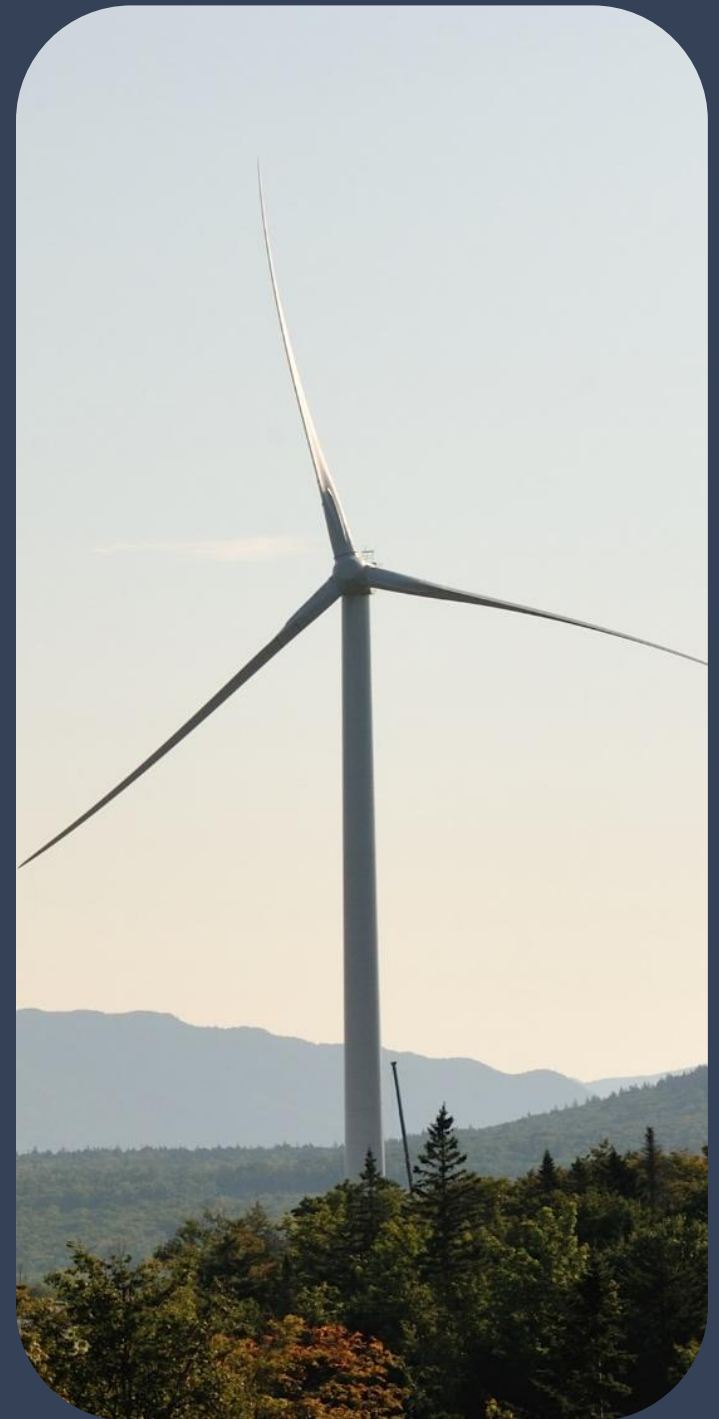

LÉGENDE

- Turbine
- Réseau Collecteur
- Chemin d'accès
- Déboisement
- Dynamitage
- Terrassement
- Fondations
- Réseau Collecteur
- Montage
- Autres

