

Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

Date: du 4 octobre au 10 octobre 2026

Travaux en semaine :

- Terrassement : Route P3 P4 P5 Branche C, D et E, Pad : T18
- Fondation : T3 T6 T7 T9 T11 T12 T17 T18
- Réception de composants d'éolienne : T22 T23 T26 T28 T30
- Montage : T1 T11 T12 T13 T15 T24 T26 T28 T29 T30
- Réseau collecteur : Excavations de tranchées de câbles SC9/SC12, L12S3 @ BJ127
Installation de câbles: L14S6 @ BJ147, SC9/SC12, L12S3 @ BJ127
Remblai de tranchées de câbles : FOR 3 @ FOR 2, For 11 @ BJ147, SC9/SC12
Autre : Sous-Station et O&M

Règles de sécurité :


- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boute-feu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

Contact :

- CA-quebeceolien@edf-re.com

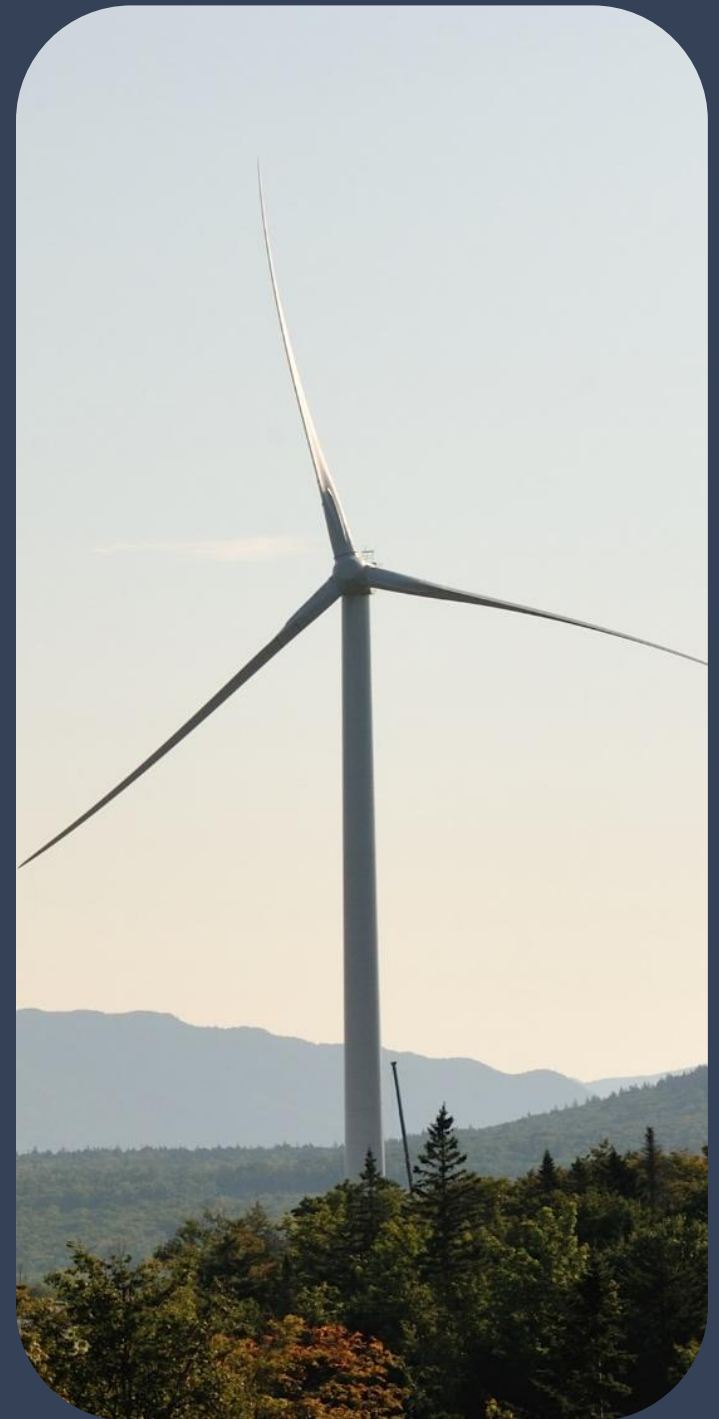

PROJET HAUTE-CHAUDIÈRE

LÉGENDE

- Turbine
- Réseau Collecteur
- Chemin d'accès
- Déboisement
- Dynamitage
- Terrassement
- Fondations
- Réseau Collecteur
- Montage
- Autres

