

Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

Date: du 22 au 28 février 2026

Travaux en semaine :

- Déboisement : Home run Ouest (à confirmer), Home run Est
- Décapage : T1 et Météo T24
- Forage : T1
- Dynamitage : T1
- Terrassement : T1 et Météo T17
- Aire temporaire : Empierrement plan de béton
- Autres : Sondage Home Run et construction des complexes Borea et EDF+ branchement internet
- Ponceaux de drainage : P1(Si obtention de AM1)
- Ponceaux traverse de cours d'eau : TA002-TA003-TA005-TA006-TA007-TA008 et TA009 (Si obtention de AM1)

Règles de sécurité :


- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boute-feu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

Contact :

- CA-quebeceolien@edf-re.com

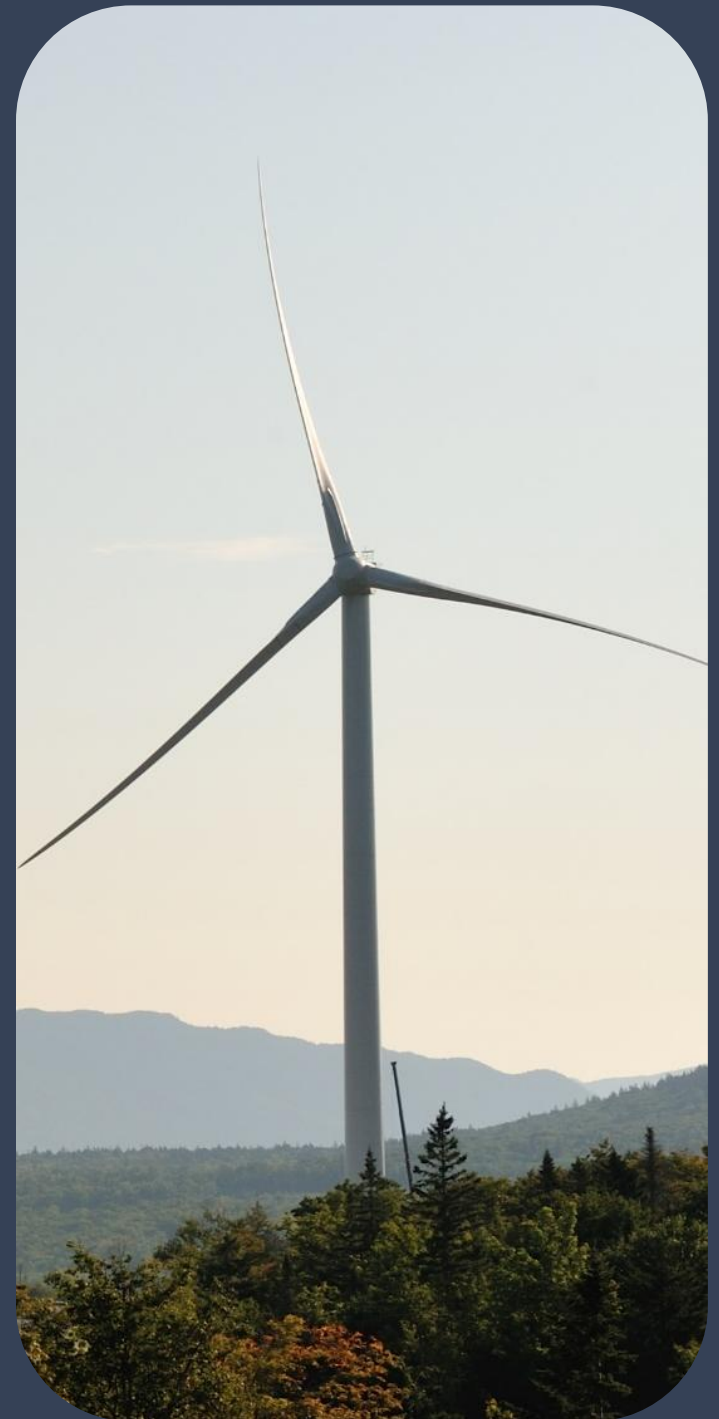

PROJET HAUTE-CHAUDIÈRE

LÉGENDE

- Turbine
- Réseau Collecteur
- Chemin d'accès
- Déboisement
- Dynamitage
- Terrassement
- Fondations
- Réseau Collecteur
- Montage
- Autres

