

Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

Date: du 12 avril au 18 avril 2026

Travaux en semaine :

- Déboisement : Branche A, B, Principale 2, 3, 4, Accès T30, T28 et Pad T29
- Terrassement : T1, T7, T15, T25, T26, T30 et Branche B
- Dynamitage : T7-T13
- Autres : Relevé chemin

Règles de sécurité :


- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :







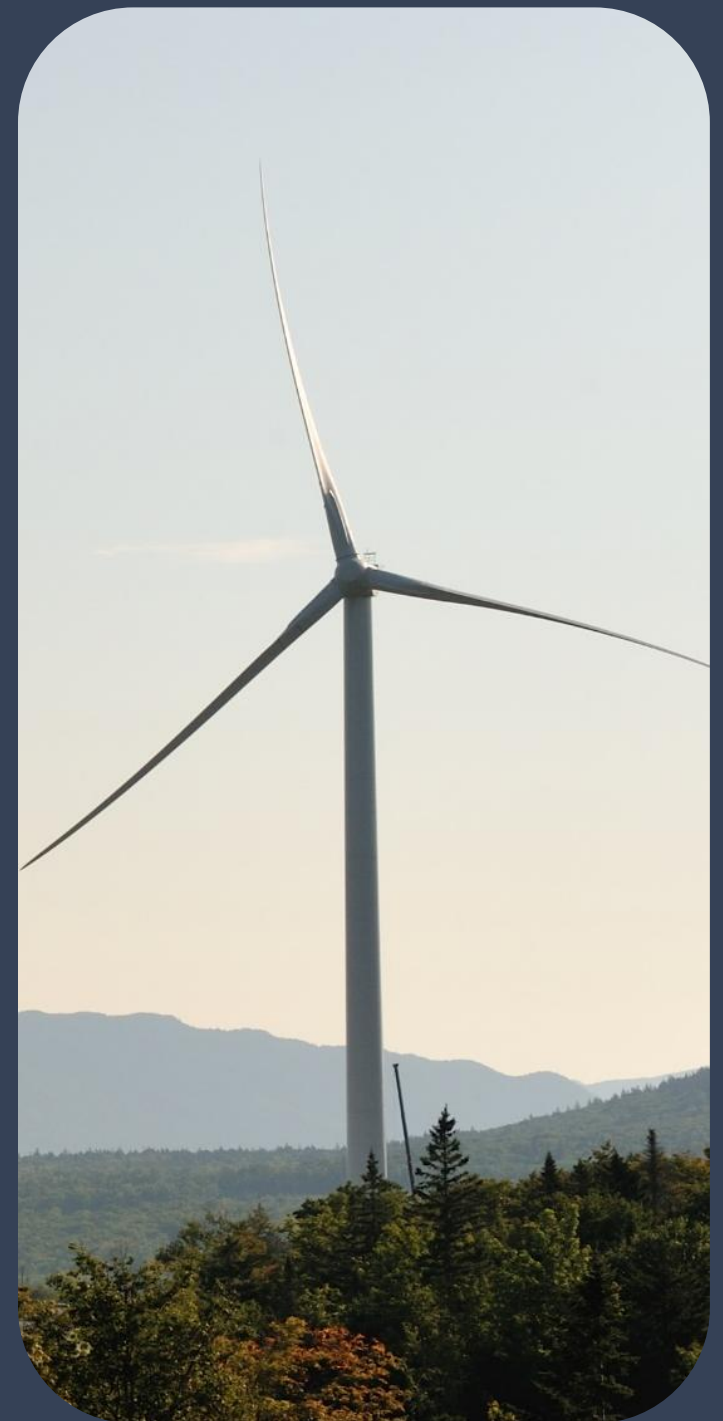



- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boutefeux que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

Contact :

- CA-quebeceolien@edf-re.com



LÉGENDE

-  Turbine
-  Réseau Collecteur
-  Chemin d'accès
-  Déboisement
-  Dynamitage
-  Terrassement
-  Fondations
-  Réseau Collecteur
-  Montage
-  Autres

