

Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

Date: du 17 mai au 23 mai 2026

Travaux en semaine :

- Terrassement : Sous-Station, plan de béton, Tour météo T24 Branche C (0+000 à 1+400) Route P1 P2 P3 P4, T11, T12, T18 T29, Branche C Pad, T27-T28-T29-T13-T17-T18-T1
- Fondation : Sous-Station
- Réseau collecteur : Forage 12 (CPKC) excavation de tranchées de câbles OH Est - SS
- Dynamitage : SCT12, T17 et T18
- Autres : Bassin de sédimentation et Transport de bois P1 km1

Règles de sécurité :


- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boute-feu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

Contact :

- CA-quebeceolien@edf-re.com

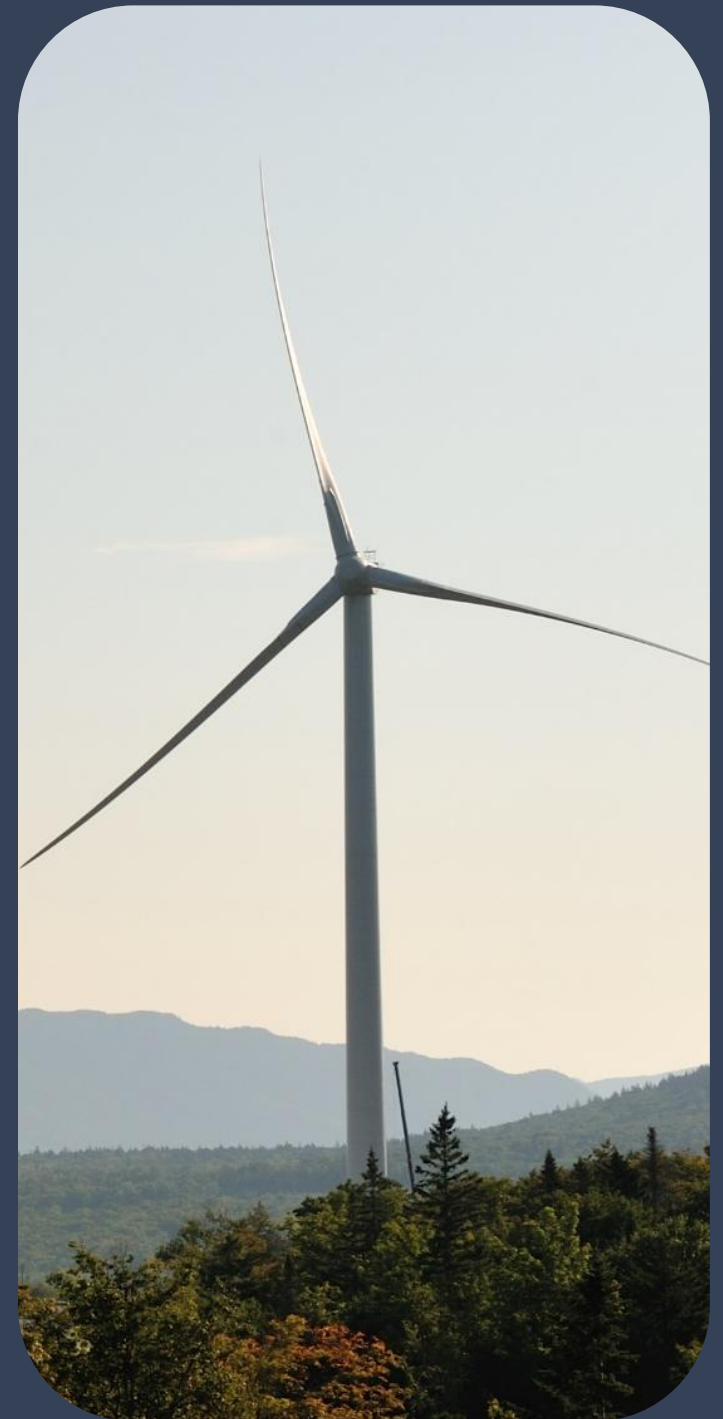

LÉGENDE

- Turbine
- Réseau Collecteur
- Chemin d'accès
- Déboisement
- Dynamitage
- Terrassement
- Fondations
- Réseau Collecteur
- Montage
- Autres

