

Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

Date: du 24 mai au 30 mai 2026

Travaux en semaine :

- Déboisement : Broyage Home run Lot 4973025
- Terrassement : Sous-Station, Tour météo T17 Route P1 P2 P3, Branche E, T12, T17, T18 T27, T28, T24, Laydown à ligne Hydro Pad, T11, T12, T27, T1, T22, T17, T18 et T23
- Fondation : Sous-Station, Tour météo T17 et T24 O&M
- Réseau collecteur : Forage 12 (CPKC) et Forage 4. Excavations de tranchées de câbles, Laydown à ligne Hydro et Forage 4 à Forage 5
- Dynamitage : route T17 et T18

Règles de sécurité :


- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boute-feu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

Contact :

- CA-quebeceolien@edf-re.com

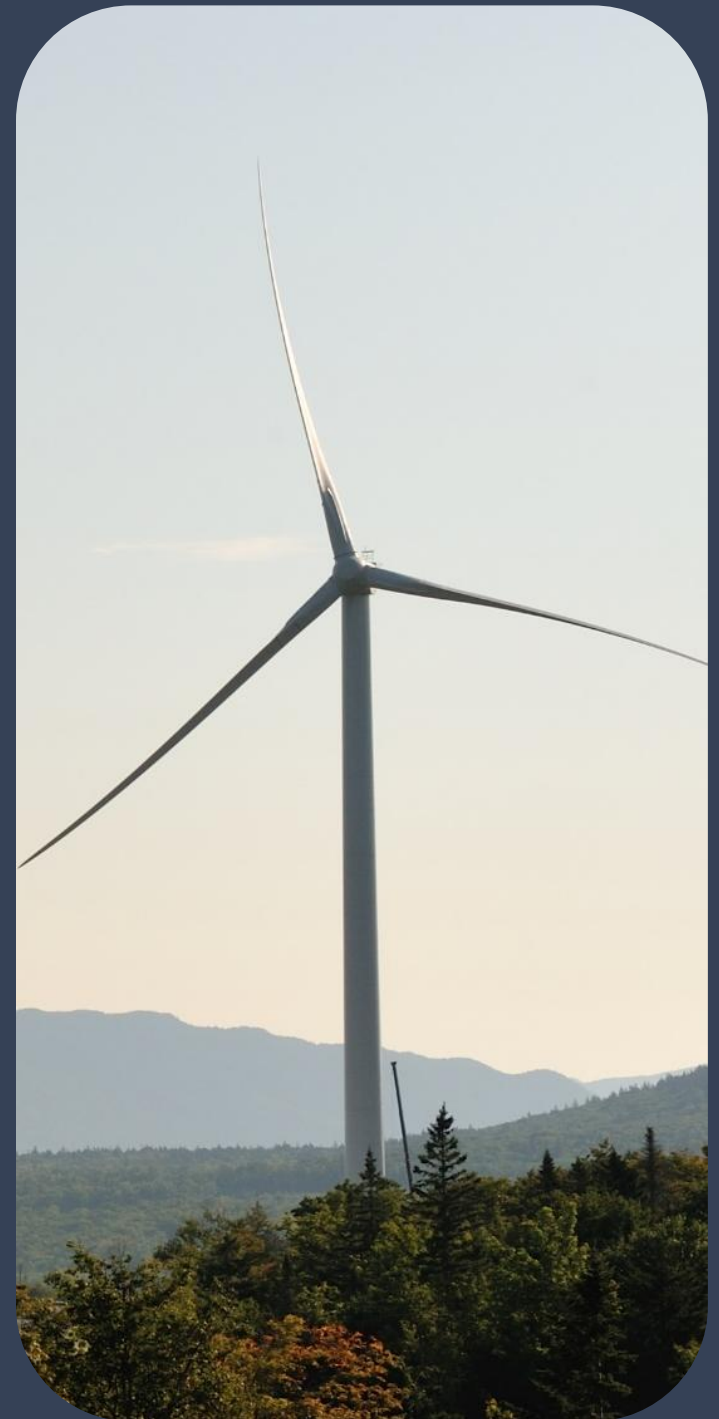

PROJET HAUTE-CHAUDIÈRE

LÉGENDE

- Turbine
- Réseau Collecteur
- Chemin d'accès
- Déboisement
- Dynamitage
- Terrassement
- Fondations
- Réseau Collecteur
- Montage
- Autres

