

# Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

**Date: du 07 juin au 13 juin 2026**

## Travaux en semaine :

- Terrassement : Sous-Station, Route P1 P2 P3 P4, T13, T15, T17 T18 T22 T23 T24 T27, Home run 4+900 @ 7+500, Forage 5 @ Forage 4 Pad : T13, T15, T17 T18, T23, T24, T27.
- Fondation : Sous-Station, O&M
- Réseau collecteur : Forage 10 et Forage 4. Excavations de tranchées de câbles : 11+600 @ 12+750 (Sable) / 11+250 @ Forage 10 (Creuser). Installation des câbles : BJ115 a L11S5
- Dynamitage : route T18
- Autre : Essais de convenance

## Règles de sécurité :


- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

## Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boute-feu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

## Contact :

- [CA-quebeceolien@edf-re.com](mailto:CA-quebeceolien@edf-re.com)

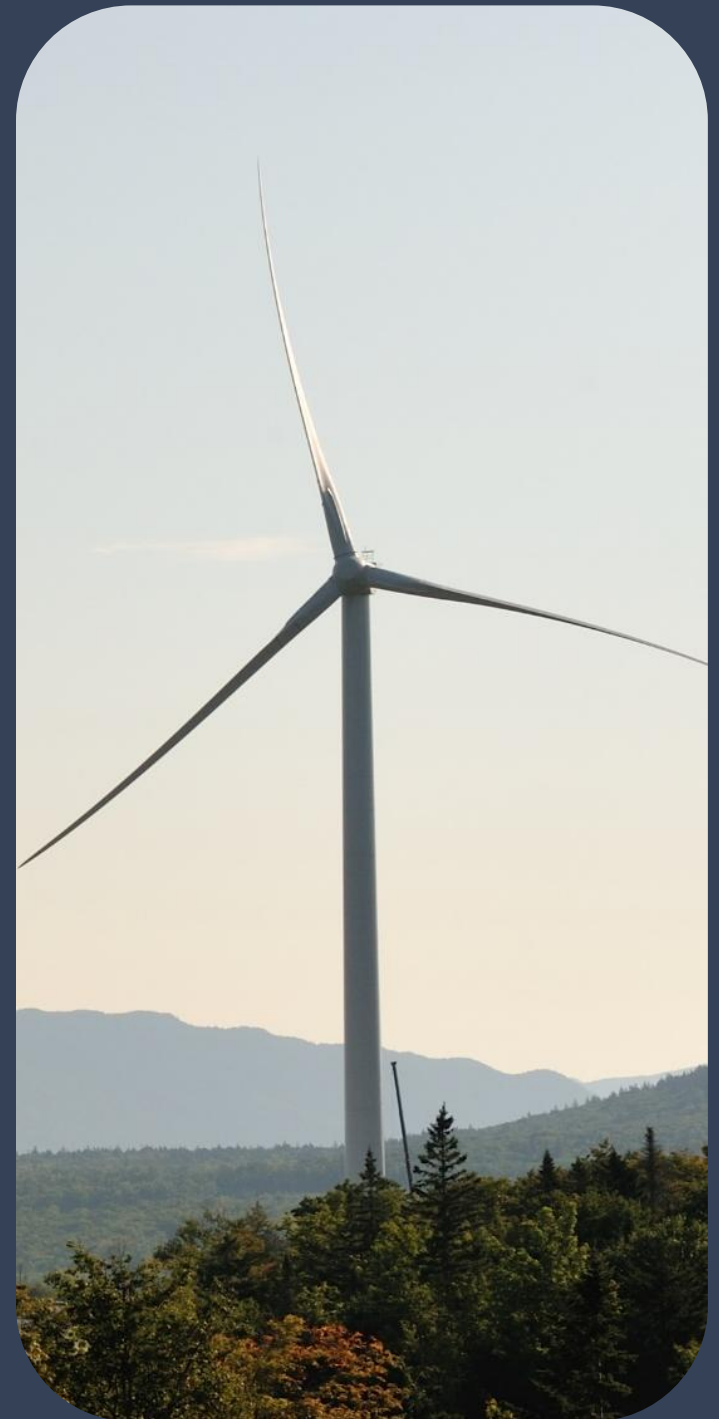

PROJET HAUTE-CHAUDIÈRE

LÉGENDE

- Turbine
- Réseau Collecteur
- Chemin d'accès

Déboisement

Dynamitage

Terrassement

Fondations

Réseau Collecteur

Montage

Autres

