

Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

Date: du 21 juin au 27 juin 2026

Travaux en semaine :

- Terrassement : Sous-Station, Route P1 P2 P3 P4, Branche A et B Home run For9 à For 10, JB116 @ FOR-11 Pad : T07-T22-T23
- Fondation : Sous-Station, O&M
- Réseau collecteur : FOR-3 / FOR-7. Excavations de tranchées de câbles : FOR 9 @ TA128 et PC JB116 @ JB117. Installation des câbles : Rang 5e @ BJ-114 et BJ116 @ L11S4. Installation de boîte de jonction : BJ111, BJ121, BJ131, BJ141
- Dynamitage : route T18
- 24 Juin férié

Règles de sécurité :


- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boute-feu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

Contact :

- CA-quebeceolien@edf-re.com

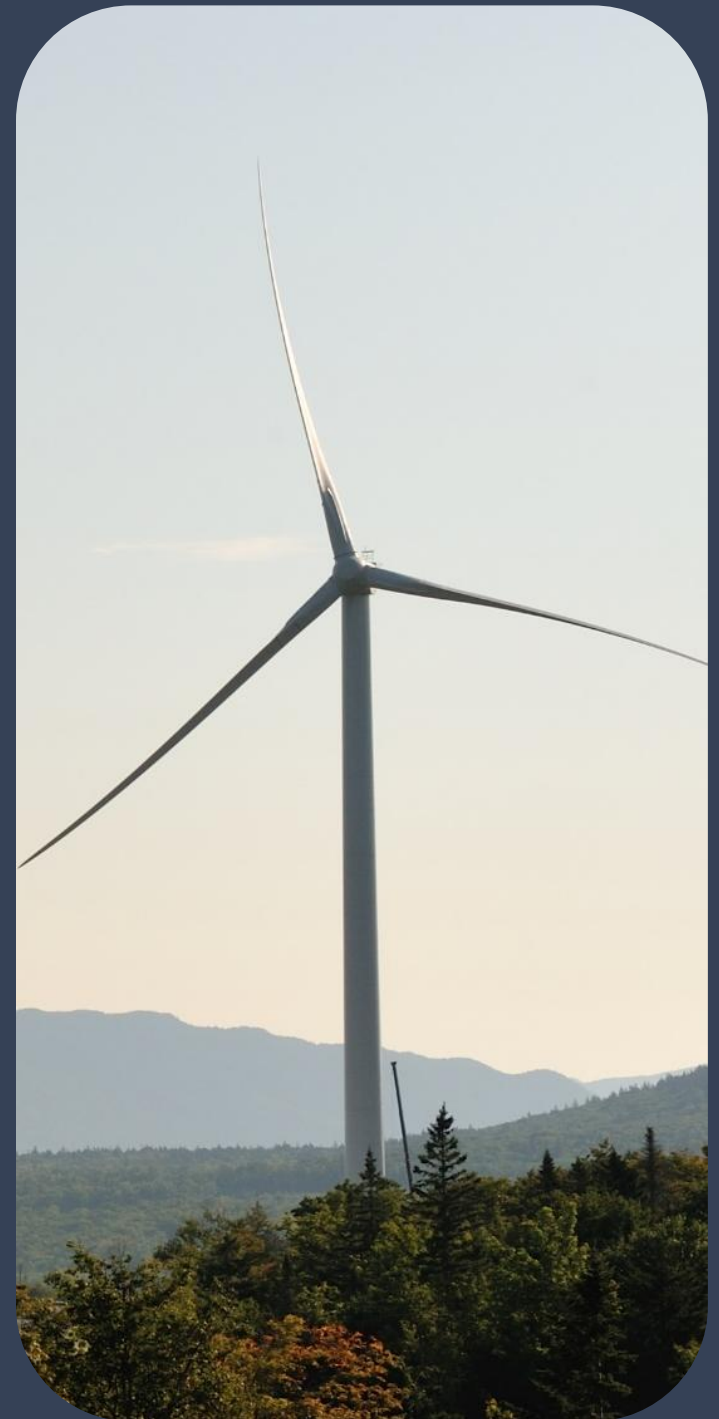

PROJET HAUTE-CHAUDIÈRE

LÉGENDE

- Turbine
- Réseau Collecteur
- Chemin d'accès
- Déboisement
- Dynamitage
- Terrassement
- Fondations
- Réseau Collecteur
- Montage
- Autres

