

Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

Date: du 28 juin au 04 juillet 2026

Travaux en semaine :

- Terrassement : Sous-Station, O&M, Route P1 P2 P3 P4, Branche A et B Home runJB117 @ T24 Pad : T24 - T25 - T26 - T27 - T28 - T29 - T30 - T07 - T01 - T03
Route : T25, T26, T27, T28, T2
- Dynamitage : Short Cut 4 et pad T28
- Fondation : Sous-Station,
- Réseau collecteur : FOR-5 / FOR-13. Excavations de tranchées de câbles Chemin FOR-8 @ BJ142 / FOR-9 @ TA128 JB117 @ T24. Installation des câbles : Rang 5 @ CH 11+600 et BJ117 @ Pont089.
- 03 juillet férié

Règles de sécurité :


- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boute-feu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

Contact :

- CA-quebeceolien@edf-re.com

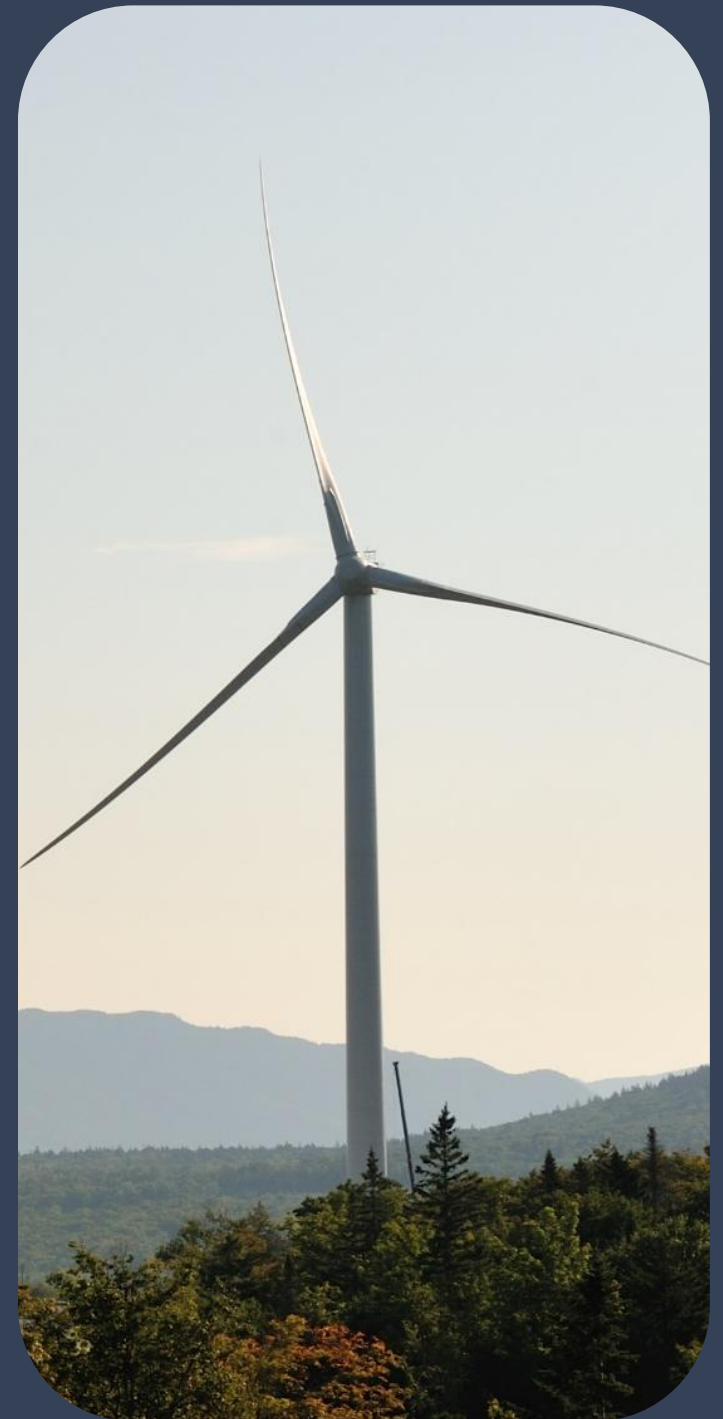

PROJET HAUTE-CHAUDIÈRE

LÉGENDE

- Turbine
- Réseau Collecteur
- Chemin d'accès
- Déboisement
- Dynamitage
- Terrassement
- Fondations
- Réseau Collecteur
- Montage
- Autres

