

Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

Date: du 02 août au 08 août 2026

Travaux en semaine :

- Terrassement : Route P2 P4 P5, Branche A B E,
Pad : T25 - T26-T27-T28 - T03 -T09-T06 Route : T07-T11-T12-T25 et T26
- Dynamitage : Short Cut 4 et pad T06, T27, T28 et Branche D
- Fondation : Pad T22 T23 T24 T29 T30
- Réseau collecteur : Excavations de tranchées de câbles FOR9 @ TA128 (tranché 2) /
FOR5 @ FOR6 et BJ1110 @ T28. Forage directionnel : FOR11
- Autre : Sous-Station et O&M

Règles de sécurité :


- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boutefeu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

Contact :

- CA-quebeceolien@edf-re.com

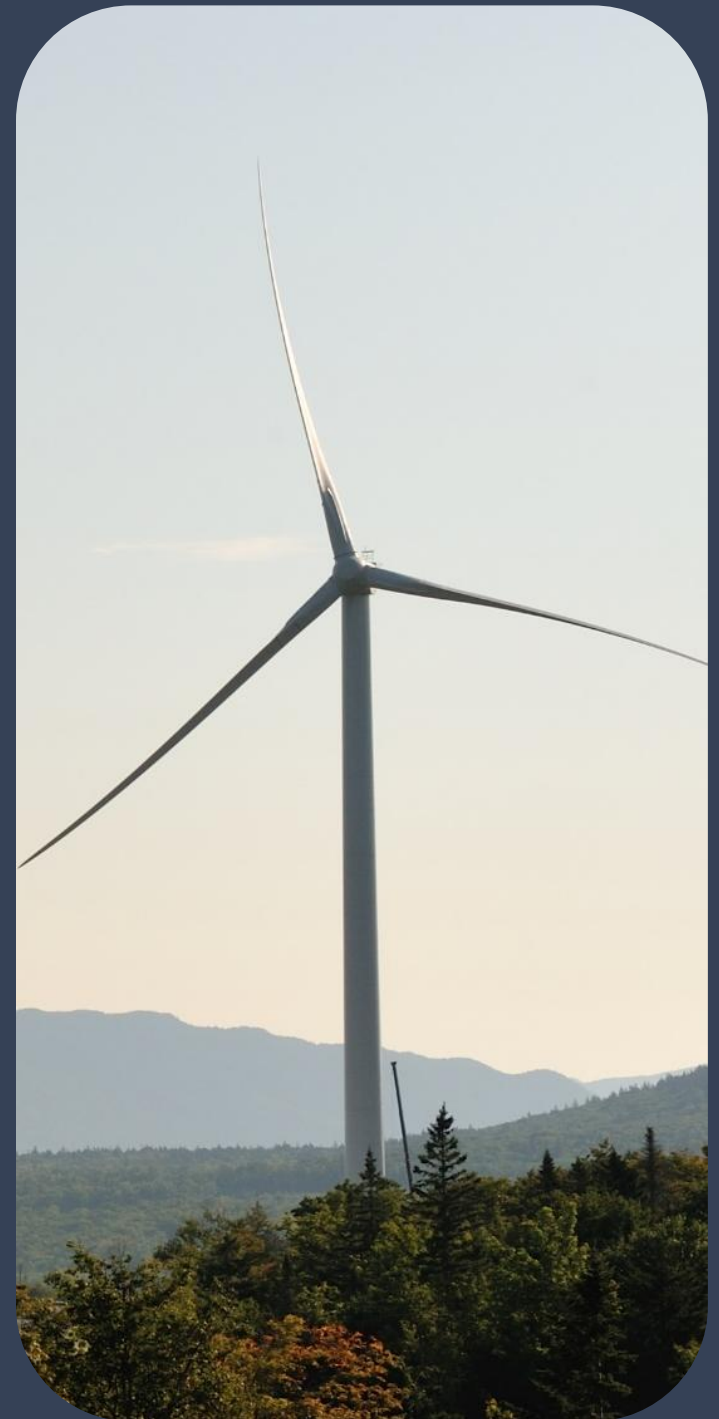

PROJET HAUTE-CHAUDIÈRE

LÉGENDE

-  Turbine
-  Réseau Collecteur
-  Chemin d'accès
-  Déboisement
-  Dynamitage
-  Terrassement
-  Fondations
-  Réseau Collecteur
-  Montage
-  Autres

Date : 7/30/2026

Préparé par : SB

Ref. : HCH_Info-Travaux

Rev. : 01

