

Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

Date: du 23 août au 29 août 2026

Travaux en semaine :

- Terrassement : Route P2 P3 P4 P5, Pad : T03-T06-T22 T23 T25 T30 Route : T03- T06
- Fondation : T30 T29 T28 T27 T26 T25 T24 T15 T13
- Réseau collecteur : Excavations de tranchées de câbles FOR 6 @ FOR 5 (Sable) FOR 6 @ FOR 7, BJ129 @ BJ127, T13 - T15 @ BJ139. Forage directionnel : FOR10
- Installation de câbles : FOR 9 @ FOR 10 (tranché 1), FOR 6 @ FOR 5, T30, T29, T28 @ fondations, T27, T26, T25 @ fondations, BJ129 @ L12S2, L12S2 @ BJ128.
- Autre : Sous-Station et O&M

Règles de sécurité :


- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boute-feu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

Contact :

- CA-quebeceolien@edf-re.com

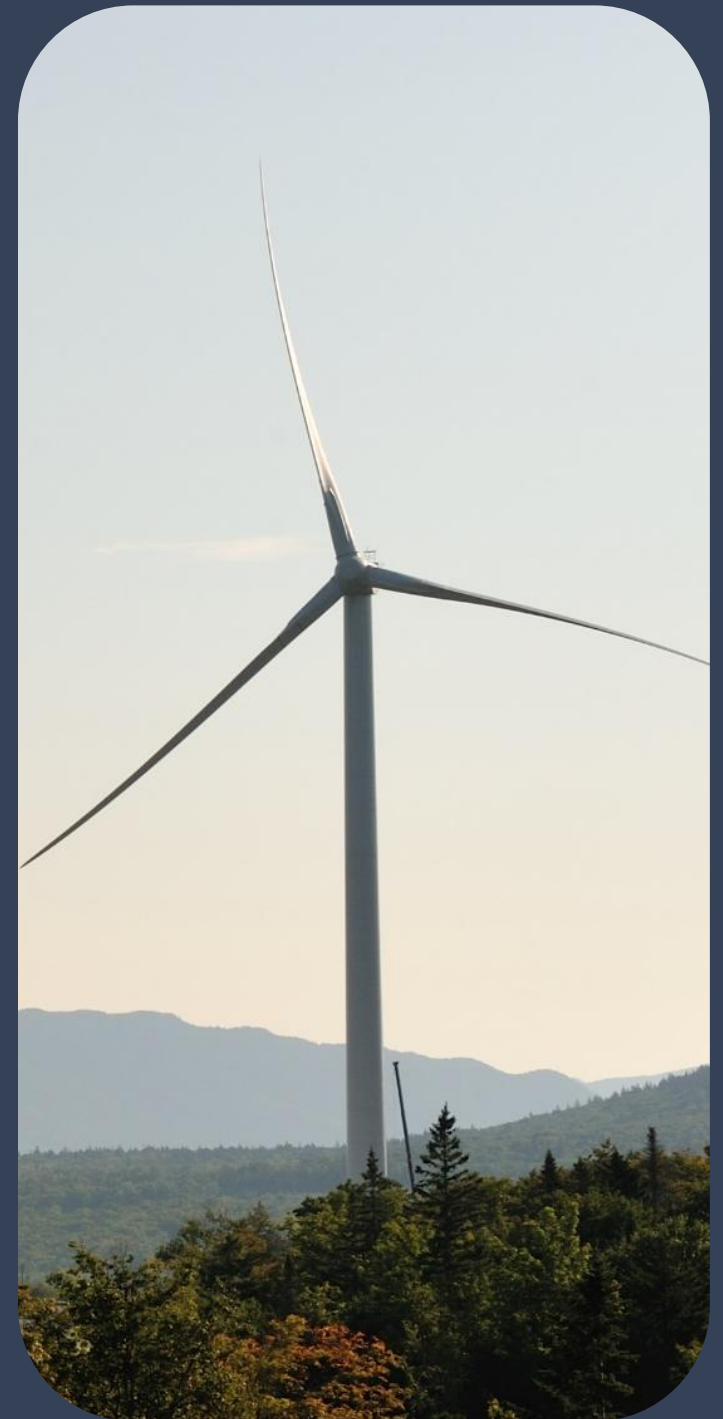

LÉGENDE

- Turbine
- Réseau Collecteur
- Chemin d'accès
- Déboisement
- Dynamitage
- Terrassement
- Fondations
- Réseau Collecteur
- Montage
- Autres

