

Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

Date: du 13 septembre au 19 septembre 2026

Travaux en semaine :

- Terrassement : Route P2 P3 P4 P5 Branche C, D et E, Pad : T18 T27 T28
- Fondation : T1 T3 T6 T7 T9 T11 T12 T13 T15 T25 26
- Montage : T30 T22 T29 T26
- Réseau collecteur : Excavations de tranchées de câbles BJ113 @ L11S8, FOR 2 @ FOR 1
Installation de câbles: FOR 7 @ Riviere, FOR3 @ FOR12, BJ113 @ L11S8
Autre : Sous-Station et O&M

Règles de sécurité :


- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.


Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boute-feu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

Contact :

- CA-quebeceolien@edf-re.com

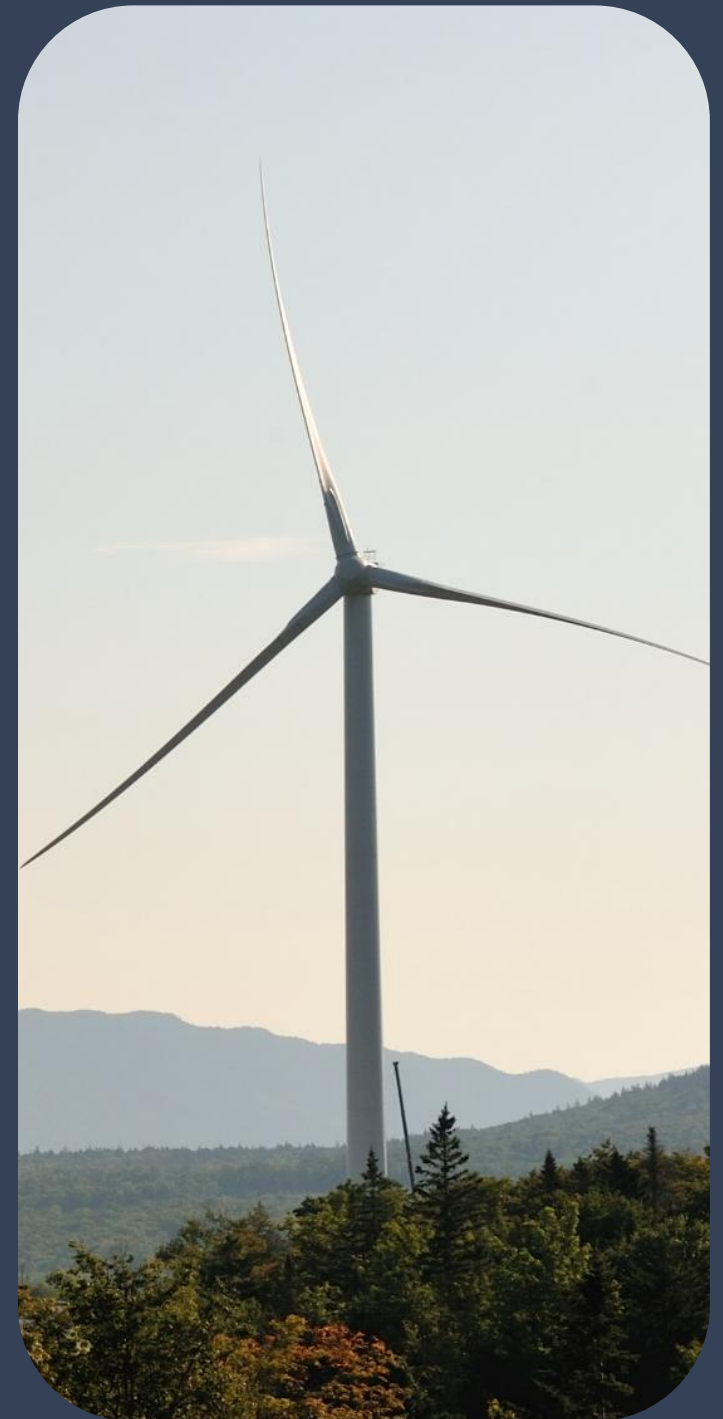

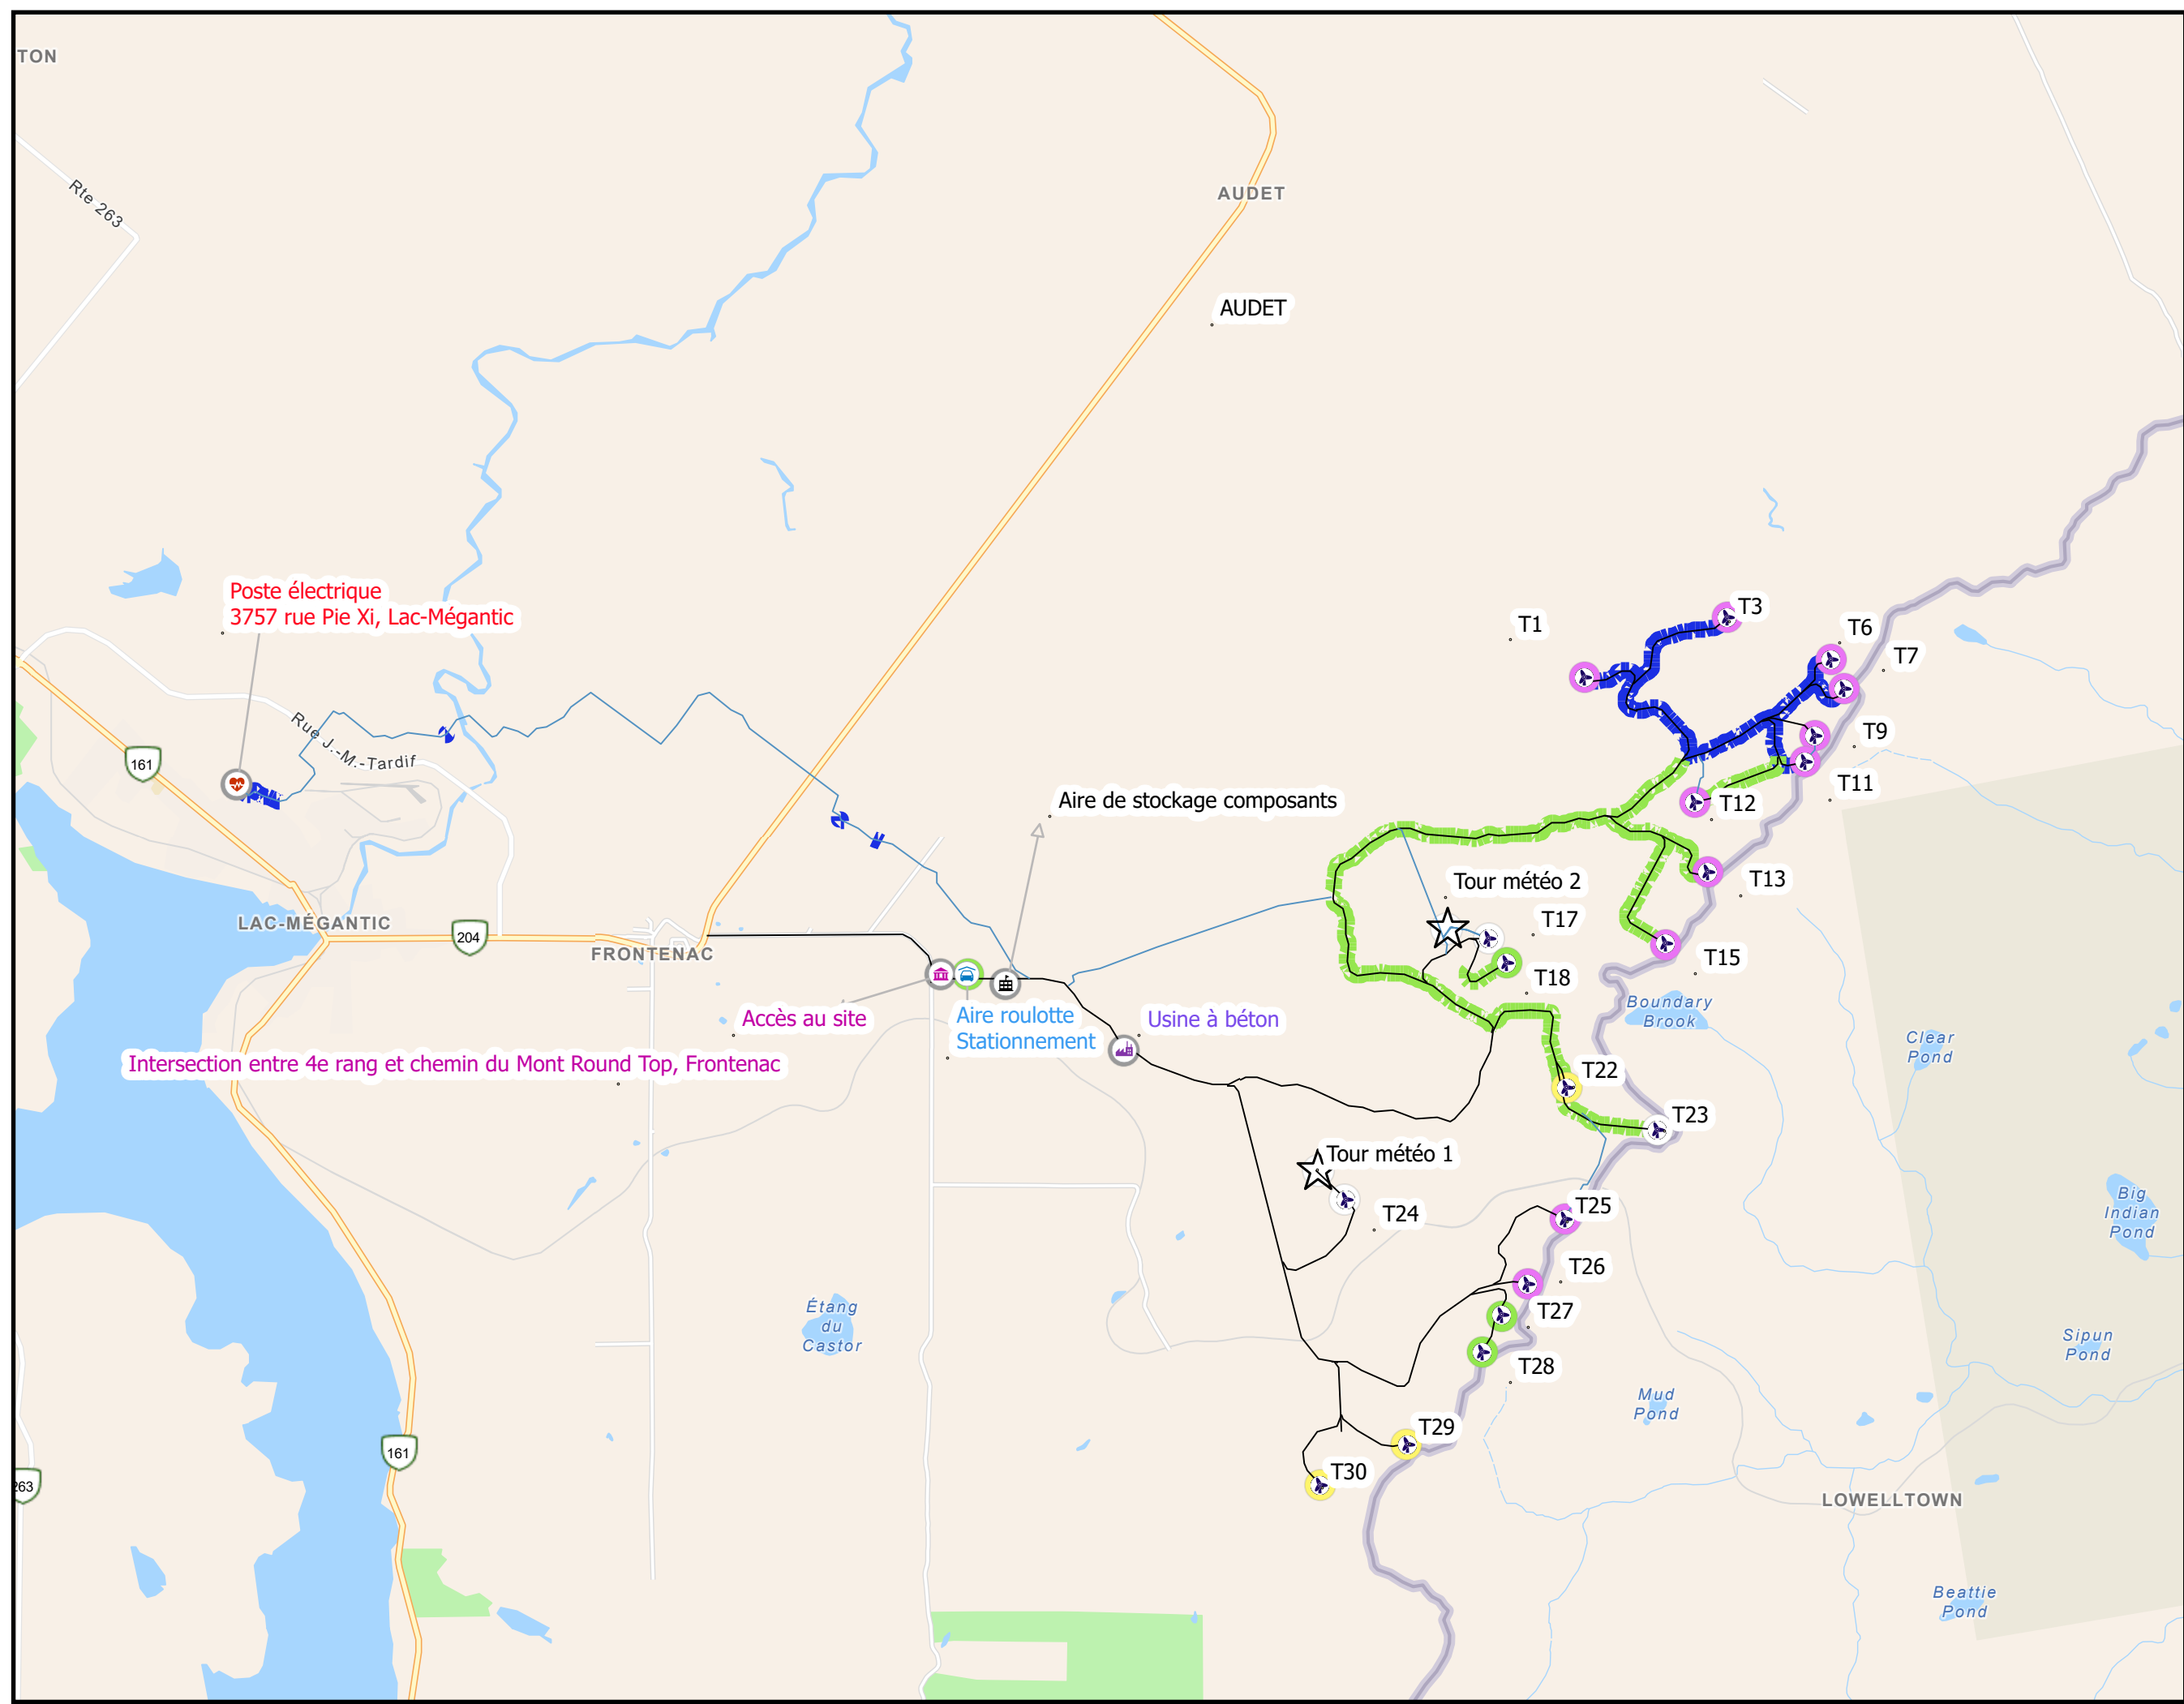

PROJET HAUTE-CHAUDIÈRE

LÉGENDE

-  Turbine
-  Réseau Collecteur
-  Chemin d'accès
-  Déboisement
-  Dynamitage
-  Terrassement
-  Fondations
-  Réseau Collecteur
-  Montage
-  Autres
